CODIQ

Fecha de actualización: 14/02/2017

Propuesta

1. CLIENTE

CODIQ, tiene como objetivo desarrollar una aplicación que le permita controlar, dar seguimiento y consultar los prestamos de mercancía que se realizan en su almacén.

No hubo una reunión de levantamiento entre **CODIQ** y ALFREDO VAZQUEZ para obtener los requerimientos de la aplicación.

Sin embargo **CODIQ** envío información que permitió al área técnica realizar esta cotización.

Si el cliente desea ampliar el alcance de esta aplicación es necesario realizar una reunión con el cliente para determinarlo.

- Ambiente WEB: Al utilizar ambiente WEB se obtienen los beneficios del servicio de la nube y la centralización de los datos para consulta desde cualquier lugar.
- **Vanguardia:** Se ofrecerá una aplicación que se podrá acceder desde cualquier dispositivo con servicio internet.
- **Eficiencia:** Se podrán obtener métricas y estadística para la mejora del proceso de llamadas.
- Robustez: La herramienta propuesta tiene la capacidad de evolucionar y crecer conforme a las necesidades del cliente.
- Seguridad.- La aplicación contará con los estándares de seguridad que rigen en aplicaciones WEB como SSL, encriptado de datos y protocolo seguro https.

3. Alcance

2. BENEFICIOS

Login	Seguridad	Pantalla que permite el ingreso seguro a la aplicación
Cat de usuarios	Seguridad	Catalogo que permite administrar usuarios. Las acciones que se pueden hacer son: a Crear b Modificar c Eliminar
Cat de alumnos	Catálogos	Catalogo que permite administrar alumnos Las acciones que se pueden hacer son: a Crear b Modificar c Eliminar
Cat de vales de préstamo - ABC	Catálogos	Catalogo que permite administrar vales Las acciones que se pueden hacer son: a Crear b Modificar c Eliminar

Listado de vales por surtir	Catálogos	Es una pantalla que muestra solamente los vales que están pendientes por surtir.
Pantalla de surtir pedido	Operación	Pantalla que permite ir surtiendo el vale al ir marcando ítem por ítem lo que ya esta surtido.
Impresión de ticket - por duplicado	Operación	Es la generación del ticket para su impresión.
Búsqueda por No de parte, usuarios, alumnos, rango de fechas	Operación	Es una pantalla que permite realizar búsquedas por: a No. parte b Usuario c Alumno d Fechas

Recibir vale de regreso	Operación	Es la pantalla que permite dar entrada nuevamente a la mercancía prestada.
Marcar vale manualmente como cerrado	Operación	Es la acción que permite marcar un vale como cerrado con algún estatus para cada no de parte.
Cat no de parte - ABC	Inventarios	Catalogo que permite administrar no de parte Las acciones que se pueden hacer son: a Crear b Modificar c Eliminar
Entrada Inventarios	Inventarios	Es la pantalla que permite dar entrada la mercancía que llega para que ésta quede lista para su préstamo.
Salida inventarios	Inventarios	Es la pantalla que permite sacar mercancía del inventario.
Estatus de no de parte	Catálogos	Son los diferentes estatus para los pedidos y los no de parte.

Carga inicial de inventario	Configuración única	Es la actividad que permite cargar el inventario para que la aplicación pueda usarse por 1a vez
Expiración de vale	Operación	Es la funcionalidad que dará de baja automáticamente todos los vales que tengan N cantidad de tiempo sin surtirse
Carga alumnos a través de archivo de texto	Configuración	Esta funcionalidad permite cargar al sistema a partir de un archivo de texto el catálogo de alumnos.

4. SOLUCIÓN TÉCNICA

Para atender la necesidad de **CODIQ** con calidad, eficiencia y rapidez estaremos presentando la solución más adecuada a las necesidades del cliente:

- Uso de la tecnología Ruby + Rails con base de datos POSTGRESQL son tecnologías largamente utilizadas en la actualidad, con varias características técnicas que posibilitan un desarrollo de un sistema muy amigable, seguro y robusto.
- El sistema será estructurado en 3 capas, es decir, tendrá las capas: base de datos (donde serán grabados los datos), reglas de negocio (donde serán ejecutadas las


lógicas de negocio del sistema) y presentación (pantallas del sistema), lo que permite más seguridad, desempeño, estabilidad y confiabilidad, además de facilitar los mantenimientos.

Ítem	
Lenguaje de	Ruby + Rails JAVAScript,
programación	Json,
Aplicativos / Herramientas	NginX
Base de Datos	PostgreSQL

5. AMBIENTE DE DESARROLLO

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto será usada la Metodología SCRUM-AGILE de Desarrollo, que contempla las siguientes fases y actividades:

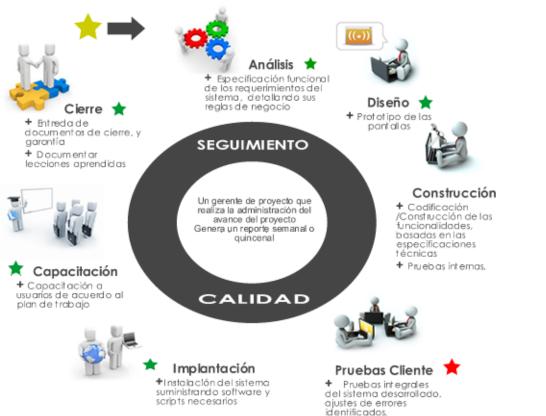



Cliente colabora
Cliente ejecuta
En el caso que se requieran
nuevas capacitaciones, CODIQ
deberá, con antelación, solicitar
a ALFREDO VAZQUEZ para
planear y valorar las horas
necesarias para su ejecución,
esto podrá tener un costo
adicional que será negociado
entre las partes

7. Plan de trabajo

ALFREDO VAZQUEZ asignará un gerente de proyecto para la administración de este proyecto, que realizará el

seguimiento de los trabajos / actividades previstas, cumplimiento del plan de trabajo, así como la comunicación formal y negociaciones de avances con el cliente. Nosotros sugerimos que **CODIQ** asigne:

 Un responsable por su seguimiento (líder de proyecto), para facilitar la comunicación, accesos, acuerdos, cumplimento del cronograma y mitigar posibles riesgos.

El arranque del proyecto se dará a través de una junta de Kick off, donde se formalizará todos los acuerdos, métodos a ser seguidos, responsables, juntas de seguimientos semanales/ quincenales.

El plan de trabajo deberá ser seguido, aunque podrá sufrir cambios durante el proyecto. Estos cambios podrán generar la realización de trabajos no previstos o aumento de las

8. Garantía de Entrega ALFREDO VAZQUEZ

Para garantizar la entrega a tiempo de proyecto, ALFREDO VAZQUEZ ofrece su propia garantía de entrega. Funciona de la siguiente manera:

- Mensualmente ALFREDO VAZQUEZ entregara un reporte que incluya los retrasos de proyecto. Estos pueden ser tanto de cliente como propios. ALFREDO VAZQUEZ registrara las horas trabajadas por ambos y las comparara contra las estipuladas en el plan de trabajo.
- Cada retraso se revisará, se tratará y podrá ser negociable tanto en tiempo como en costos.

horas estimadas. Para eso se evaluará la necesidad de revisión de costos y consecuente cobro.

El tiempo estimado de finalización del proyecto es de: 10-13 semanas aproximadamente.

El proyecto se iniciará en hasta 5 días hábiles, a contar de la fecha de la aceptación formal (contrato).

La revisión mensual de este archivo permite realizar a tiempo ajustes para garantizar la entrega a tiempo del proyecto y le entrega al cliente la posibilidad de terminar antes su desarrollo y así empezar a recibir los beneficios que este le brinda a su proceso antes de tiempo.

9. Análisis de Impacto / cambios de alcance

Cambio de alcance significa toda y cualquier solicitud de cambios en la solución inicial (alcance) acordada.

En el caso que se requiera un cambio de alcance, el equipo de **ALFREDO VAZQUEZ** evaluará el impacto en plazo y costo y se requerirá la formalización de la solicitud del cliente. Con el Visto bueno de la solicitud y del análisis de impacto, las

dos empresas negociarán el costo para el desarrollo, considerando una propuesta adicional y nuevo plan de trabajo

10. No se incluye

No forma parte del alcance del proyecto:

• Desarrollos de funcionalidades no especificadas en esta propuesta.

- Opción de funcionamiento del sistema en otro idioma que no sea el español.
- Soporte, mantenimiento y renta del hosting contratado.

11. Garantía

Para el proyecto, **ALFREDO VAZQUEZ** garantiza por **60** días naturales después de la aceptación dada por **CODIQ** al Cierre del proyecto.

La garantía corresponde a defectos en el software entregado y versionado. No existirá garantía en caso que se cambie las reglas de negocios involucrados o si el cliente u otro proveedor hayan cambiado el producto que entregamos.

Propuesta Económica

Cotización Incluye:

Sistema de inventarios	Monto
Anticipo (50%)	\$38,665.00 MXN
1 (uno) Mensualidad de:	\$38,665.00 MXN
TOTAL	\$77,330.00 MXN

 Una vez terminado el periodo de garantía de 60 días naturales, no se incluye soporte técnico post implantación. El cliente podrá solicitar este servicio adicionalmente. **ALFREDO VAZQUEZ** presentará una propuesta económica de soporte.

Notas y consideraciones generales:

- Los precios anteriormente mencionados están en pesos mexicanos y NO incluyen el 16% de IVA.
- Se pagará dentro de los primeros cinco días hábiles a partir de la entrega de la factura.

Sin más por el momento reciba saludos, Atentamente

> Jesús Alfredo Vázquez Gerente de Proyecto

Tel: 442 325 6218; 55 4534 4308

jesuscervin@icloud.com
